

Projet SAE24+21 - R&T Lannion

Plan de Management de Projet

Version :	4	
Date d'édition :	14 Mai 2026	
Auteurs :	Quentin Delafosse et Louison Renault.	
Résumé :	Ceci est le PMP du "projet de Réseau" inscrit dans notre formation de 1 ^{re} année R&T (Semestre 2 – 2025-2026)	
Date de début du projet :		14 Janvier 2026
Date de livraison de ce document :		14 Mai 2026
Date de fin de projet prévue :		16 Juin 2026
Coût global prévisionnel du projet en € :		aucun

SOMMAIRE

1. GÉNÉRALITÉS	2
1.1. Objet de ce Plan de Management de Projet (PMP)	2
1.2. Terminologie	2
2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET	2
3. ORGANIGRAMME DES TÂCHES	3
4. LIVRABLES	3
5. SYNTHÈSE BUDGET ET RESSOURCES	4
6. ORGANISATION DU PROJET	4
6.1. Membres de l'équipe projet	4
6.2. Organisation du travail au sein de l'équipe	4
6.3. Planning du projet	5
7. SUIVI ET PILOTAGE DU PROJET	5
7.1. Suivi d'avancement interne projet	5
7.2. Management des risques	7
7.3. Communication	7
7.4. Bilan	7

1. Généralités

1.1. Objet de ce Plan de Management de Projet (PMP)

Ce document décrit l'organisation et l'ensemble des dispositions mises en place pour atteindre les objectifs du **Projet SAE24+21 du BUT R&T Lannion** (Semestre 2 – 2025-2026).

1.2. Terminologie

Sigles	Libellé
ETE	Évaluation du Travail d'Équipe
PMP	Plan de Management de Projet
RDV	Rendez-vous
VLAN	Réseau virtuel


2. Présentation générale du projet

Mettre en réseau un hotel en cours de construction avant 2027

Le projet Réseau de 1re année est une activité pédagogique durant laquelle les étudiants travaillent en groupe, de janvier à juin, sur la mise en réseau d'un hôtel fictif en construction. Il s'agit de concevoir, planifier et déployer les infrastructures réseau (câblage, services, serveurs) en tenant compte des contraintes techniques et organisationnelles.

Ce projet vise à mettre en œuvre concrètement les compétences liées aux réseaux (VLAN, adressage, sécurité, services), mais aussi à développer le travail en équipe, la communication professionnelle et la gestion de projet (planning, budget prévisionnel, documentation technique).

3. Organigramme des tâches

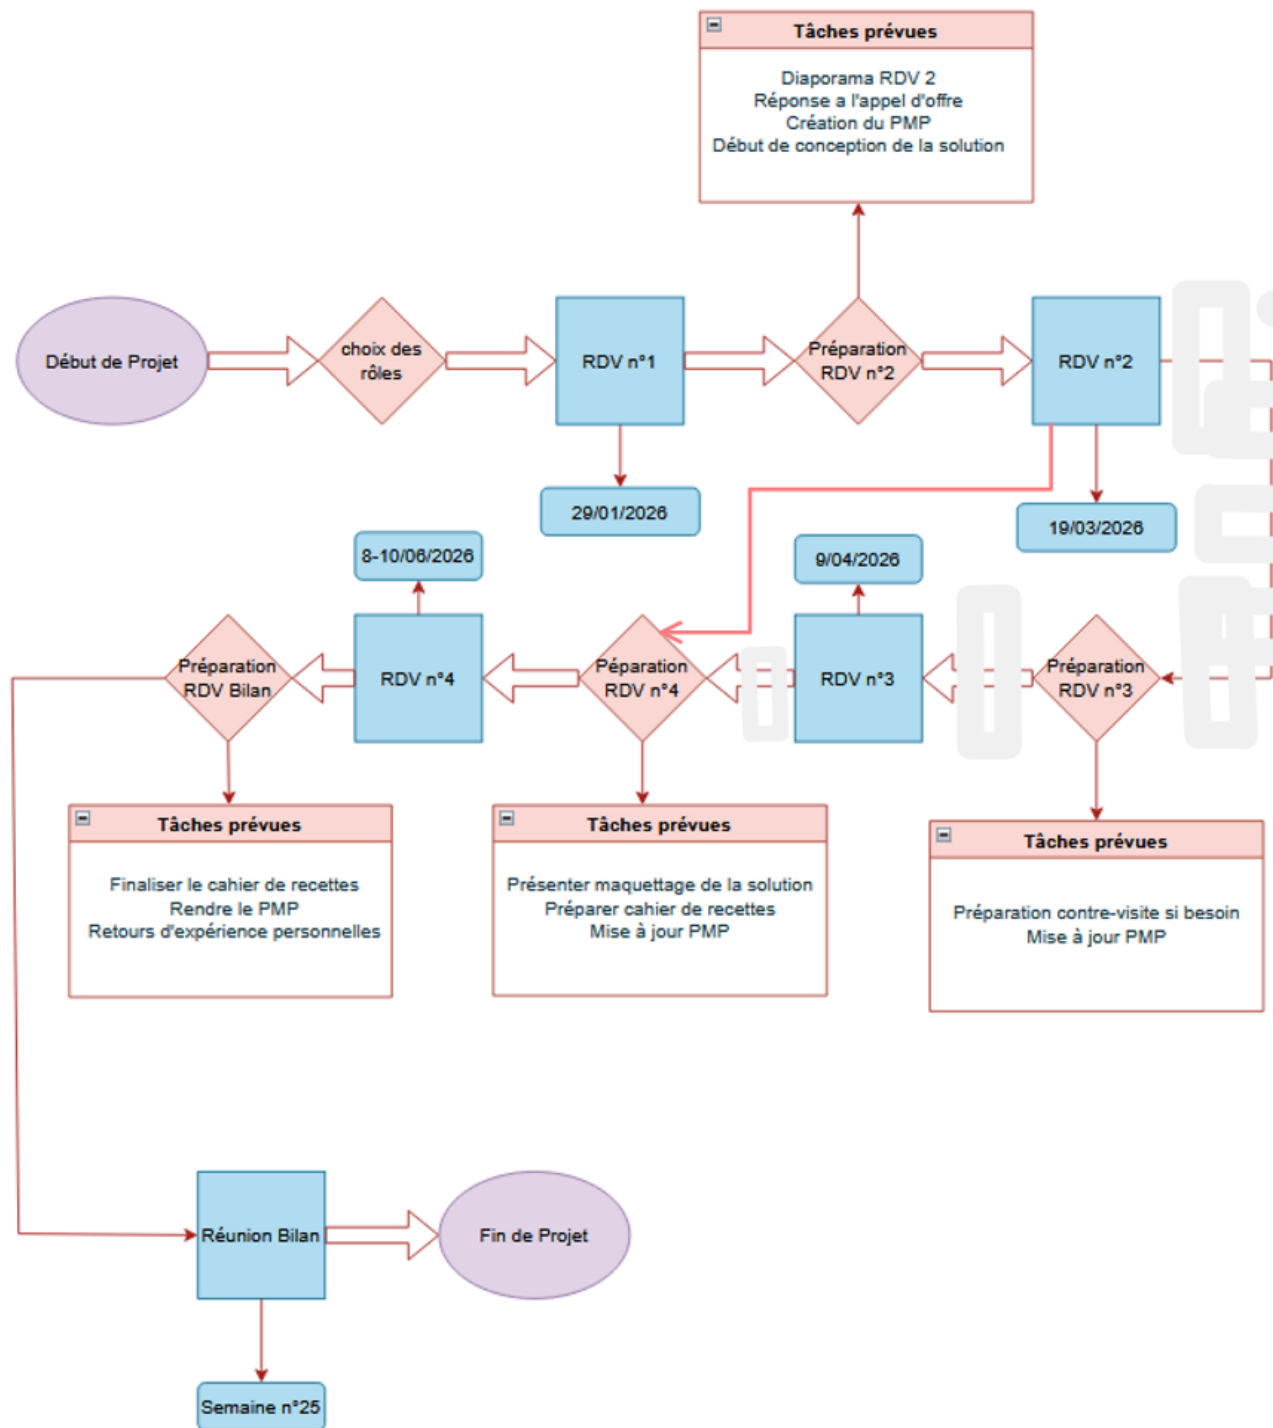

4. Livrables

Les livrables de ce projet seront les suivants :

Date	Livraison	Lieu	Heure	Rendu
14/01/26	Choix client Initiation évaluation travail équipe	Moodle	12h15	Oui

03/02/26	PMP V0 + ETE V0 Dossier gestion de projet	Moodle	15h30	Oui
10/02/26	PMP V1 Dossier gestion de projet	Moodle	17h45	Oui
02/03/26	PMP V2 + ETE V1 Dossier gestion de projet	Moodle	17h45	Oui
17/03/26	dossier complet pour le RDV2 + ETE V2 Dossier gestion de projet	Moodle	18h	Oui
19/03/26	Oral RDV2	Salle TD	13h30	Oui
31/03/26	PMP V3 + ETE V3 Dossier gestion de projet	Moodle	12h15	Oui
07/04/26	Dossier complet RDV3 + ETE V4	Moodle	12h15	Oui
09/04/26	Oral RDV3	Salle TD	11h45	Oui
30/04/26	Architecture logique, Architecture matérielle Schéma de dépannage de la maquette	Moodle	13h30	Non
12/05/26	PMP V4 + ETE V5	Moodle	17h30	Non
19/05/26	PMP V5	Moodle	17h30	Non
26/05/26	PMP V6 + ETE V6	Moodle	17h30	Non
02/06/26	PMP V7	Moodle	17h30	Non
10/06/26	Le schéma de dépannage complet de la maquette La liste des pages du serveur Web avec les restrictions d'accès mise en œuvre Les schémas de conception du service Active Directory	Salle TP	12h	Non
10/06/26	Oral RDV4	Salle TP	13h30	Non
11/06/26	PMP version finale	Moodle	12h	Non
Semaine 25	ETE version finale	Moodle	?	Non
16/07/26	retour d'expérience	Salle TD	11h15	Non

5. Synthèse Budget et Ressources

Aucun budget n'est alloué à ce projet.

6. Organisation du projet

6.1. Membres de l'équipe projet

Quentin (Chef de projet & Responsable technique) :

- Organiser l'équipe, communiquer avec le client.
- Créer les maquettes, positionner & configurer l'équipement, créer une table d'adresses ip.
- Enregistrer les configurations des switches et faire le dhcp du poste étage.

Louison (Maître de l'organisation et Co-Responsable technique) :

- Choisir l'équipement, estimer le prix, calculer les heures de travail.
- Enregistrer les configurations des switches et du routeur et faire le dhcp du poste rez-de-chaussée.
- Organiser les réunions pour avancer le travail.

6.2. Organisation du travail au sein de l'équipe

Il y a au moins une réunion par semaine avec toute l'équipe afin d'échanger sur la progression personnelle de chacun et de s'entraider sur les tâches les plus ardues. Ce chiffre peut évoluer en fonction du temps et des besoins de l'équipe. Les travaux finis sont ensuite partagés sur le groupe de travail pour obtenir des avis.

6.3. Planning du projet

	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25
Effectuer un meeting hebdomadaire	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tenir au courant le client	X		X		X		X		X		X		X										
Lister les besoins du client		X	X	X																			
Rdv1			X																				
Adresser les ips et les réseaux			X	X																			
Imaginer les VLANs			X	X																			
Choisir les équipements			X	X																			
Calculer les dépenses			X	X																			
Imaginer l'emplacement des machines			X	X	X																		
Créer le schéma logique					X																		
Estimer le temps de travail					X	X	X																
Créer le schéma de câblage					X	X	X	X	X														
Créer le schéma d'architecture					X	X	X	X	X														
Assigner les VLANs sur les schémas							X	X	X														
Créer une diapositive							X	X	X	X	X	X	X										
Se préparer pour l'oral								X	X	X	X	X	X										
Rdv2										X													
Corriger le diapo											X	X											
Corriger les schémas											X	X											
Rdv3														X									
Préparer Schéma dépannage														X	X	X	X						
Configurer switches & routeurs																	X	X					
Configurer serveur DHCP																	X	X					
Configurer serveurs DNS																		X	X				
Vérifier configuration complète du réseau																				X			
Analyser retour d'expérience																						X	

7. Suivi et pilotage du projet

7.1. Suivi d'avancement interne projet (reporting)

Réunion (date, durée, type séance, présents)	Ordre du jour de la réunion (actions réalisées ou à mener)	Porteur(s) de l'action	Etat de l'action en fin de réunion		
			à prévoir	démarré	terminé
12-13/01/26 1h, Tous	Chacun de son côté : lire présentation des clients et faire un pré-choix	Tous			✓
14/01 2h autonomie	Fixer choix Client en se concertant avec les autres étudiants du groupe TP + Saisir choix sur Moodle	Tous			✓
	Choisir un "responsable des clés" pour l'équipe	Tous			✓
	Collecter les emails des coéquipiers	Quentin	✓		
	Chacun renseigne sur Moodle son Évaluation du Travail d'Équipe (prise en main de l'outil d'évalua°)	Tous			✓
19/01 1h CM présentation Tous	Collecter les emails des coéquipiers	Quentin			✓
	Vérifier l'accès aux bons dépôts sur Moodle	Tous		✓	
	Consulter les documents disponibles sur Moodle + préparer questions pour le RdV1	Tous	✓		
26/01	Préparer questions pour le RdV1	Tous		✓	

27/01 2h autonomie Tous	Vérifier accès dépôts + consulter docs sur Moodle	Tous			✓
	Préparer questions pour le RdV1	Tous			✓
29/01 30 min RdV1 Tous					
03/02 2h autonomie	Réalisation du pmp	Tous			✓
	Répartition des tâches	Tous			✓
10/02/2026 2h d'autonomie	Mise à jour du pmp	Ewenn			✓
	Schéma de vlan	Ewenn		✓	
	Schéma logique	Quentin		✓	
	Recherche de matériel	Louison		✓	
	Correction du PMP à la suite du rendez-vous				
22/02/2026	Correction du PMP à la suite du rendez-vous	Louison		✓	
01/03/2026 Tous (Ewenn retard) 2h	Amélioration PMP + création diapo Modification du schéma logique	Tous		✓	
02/03/2026 2h d'autonomie	Mise à jour du pmp	Tous		✓	
	Création du schéma physique	Ewenn		✓	
06/03/2026 Point d'avancement 1h	Correction du PMPv2 Debrief avec le professeur	Tous		✓	
10/03/2026 2h d'autonomie	Modification et ajout de ressources à la diapo absent Ewen	Tous		✓	
13/03/2026 2h d'autonomie	Finalisation de la diapo absent Ewen	Tous		✓	
14/03/2026 2h; tous	faire le travaille d'ewen (shéma de câblage, schéma physique) + diapo	Quentin Louison		✓	
15/03/2026 2h; tous	faire le travail d'ewen (shéma de câblage, schéma physique) + diapo	Quentin Louison		✓	
16/03/2026 2h; tous	faire le travail d'ewen (shéma de câblage, schéma physique) + diapo	Quentin Louison			✓
19/03/2026 2h RdV2 Tous	Presentation de la solution	Tous			✓
21/03/2026 2h; tous	Travailler la technique du projet pour la remédiation	Quentin Louison			✓
23/03/2026 Remédiation technique 2h; tous	Schéma technique à modifier Schéma logique à modifier	Tous			✓
25/03/2026 2h; tous; autonomie	Travailler la com du projet pour la remédiation et faire la correction de la technique avec l'aide de la remédiation	Quentin Louison			✓

26/03/2026 Remédiation com 2h; tous	Diaporama à modifier : Entreprise, Devis, etc...	Tous			✓
28/03/2026 2h; tous	Faire la correction de la technique et com avec l'aide de la remédiation	Quentin Louison		✓	
31/03/2026 2h; tous; autonomie	Travailler la com du projet pour la remédiation et faire la correction de la technique avec l'aide de la remédiation	Quentin Louison			✓
07/04/2026 2h; tous; autonomie	Travailler pour le rdv 3	Quentin Louison			✓
9/05/2026 1h30 RdV3 Tous		Tous			✓
10/05/2026 2h; tous; autonomie	Travailler les schéma et architecture	Quentin Louison		✓	
12/05/2026 2h; tous; autonomie maquettage	faire la configuration des routeur, switch et le dhcp	Tous		✓	
19/05/2026 2h; tous; autonomie maquettage	vérifier configuration des routeur, switch et faire le serveur DHCP	Tous	✓		
26/05/2026 2h; tous; autonomie maquettage	vérifier fonctionnement de la conf DHCP et mettre en place les serveurs DNS	Tous	✓		
29/05/2026 2h; tous; autonomie		Tous	✓		

7.2. Management des risques

Absence (Maladie, Rendez-vous, ...) : redistribuer le travail de la séance en conséquence et potentiellement le réduire.

Retard, soucis de ponctualité : communiquer avec le groupe et mettre en place des règles.

La clé USB ne fonctionne pas lors du Rdv3 : prévoir une autre clé de secours.

Perte des fichiers de conf stockés sur clé/absence du membre : Déposer sur discord et sur les PCs personnels.

7.3. Communication

Discord : (Réunion vocale avec l'équipe, Partage d'informations)

Google Drive: (Partage de document)

Word ; Excel ; Powerpoint: (Modification des documents)

7.4. Bilan

Notre projet fonctionne bien dans l'ensemble, à ce stade aucun objectif n'a été validé à 100%. Les améliorations possibles sont notre communication au sein du groupe ainsi que notre organisation

prévisionnelle avant chaque réunion. Afin d'y remédier nous prévoyons bien à l'avance les tâches pour ne pas être surpris du travail à effectuer.

Pour conclure, le projet avance bien et la cohésion d'équipe est bonne. Nous avons établi la liste des tâches et les phases du projets. Il nous reste désormais à les effectuer. Nous avons par ailleurs quelques lacunes auxquelles nous allons remédier telles que notre méthodologie de travail et la création de supports graphiques via une pratique hebdomadaire (pendant les réunions, ex : schéma logique, etc...).

Depuis le départ de notre camarade Ewenn, la charge de travail s'est intensifiée. En effet nous avons son travail à se répartir et les modifications pour le Rdv3 à effectuer. Nous avançons tout de même bien et sommes bientôt prêts pour le Rdv.

Le Rdv3 est maintenant passé et la partie réalisation commence. Nous devons donc commencer à mettre en place le réseau et les services qui le composent. Les switch (Aruba et Cisco) sont prêts et les configurations semblent bonnes. Il nous faut maintenant passer au serveur DHCP et vérifier la connectivité.

7.5. Gestion du document PMP

Adresser toute remarque sur ce document au responsable de sa gestion :

Quentin Delafosse

quentin.delafosse@etudiant.univ-rennes.fr Tél : 02 56 44 86 25

Version	Date	Action ¹	Nature de la modification
0*	3 Février 2026	C	Création du document
0.2	6 Février 2026	M	Modif des livrables, du bilan et du management des risques.
1.0	10 Février 2026	M	Mise à jour du PMP
1.1	22 Février 2026	M	Modification par rapport au feedback (chap : 1; 2; 4; 7.1; 7.4; 7.5) Suppression par rapport au feedback (chap : 6.1; 7.1)
1.2	1 Mars 2026	M	Chap : 3 - 4 - 7.6 - 7.2 - 7.1 - 7.3 - 7.5 - Titre
2	4 Mars 2026	M	Titre
2.1	10 Mars 2026	M	Chap : 4 - 7.1
2.2	28 Mars 2026	M	chap : 4 - 7.1
3	31 Mars 2026	M	chap : 7.1 - 7.4 - 7.2 - 7.3 - 1.2 - 6.3
4	14 Mai 2026	M	chap : 7.1 - 7.4 - 7.2 - 6.1 - 6.3 - 4 - 3

¹ Action = C : Création, M : Modification, S : Suppression, A : Approbation

Annexe : échanges avec le client



Avancé du projet & questions

11 Février 2026 16:10

Expéditeur : "Quentin Delafosse Leprevost" <quentin.delafosse@etudiant.univ-rennes.fr>

À: "Laurence Gallas" <laurence.gallas@univ-rennes.fr>

Cc: "Louison Renault" <louison.renault@etudiant.univ-rennes.fr>

"Ewenn Ruellou" <ewenn.ruellou@etudiant.univ-rennes.fr>

"Valerie Le Palmec" <valerie.le-palmec@univ-rennes.fr>

Faux_plafond.png (140 ko) [Télécharger](#) | [Supprimer](#)
 Local_technique.png (480,4 ko) [Télécharger](#) | [Supprimer](#)
[Afficher toutes les photos](#)
[Télécharger toutes les pièces jointes](#)
[Retirer toutes les pièces jointes](#)

Bonjour madame Anderson,

Nous avançons bien sur le projet, en effet l'organisation ip du réseau est terminée et les différents schémas sont en cours de création.

Une question nous ai venu notamment vis à vis du local technique qui contiendra la baie de brassage. Il y a deux pièces qui pourraient correspondre à nos besoins. La première est celle qui se trouve à côté du local à déchets près des ascenseurs. La seconde est le local d'entretien à côté du garage. Pensez-vous que nous pourrions exploiter l'une d'entre elles ?

Par ailleurs concernant l'installation des câbles, pourriez-vous nous dire ce que représentent les pointillés sur le second schéma ci-joint ?

Très cordialement,
M. Delafosse Quentin
Chef de Projet



Re: Avancé du projet & questions

13 Février 2026 12:36

Expéditeur : "Laurence Gallas" <laurence.gallas@univ-rennes.fr>

À: "Quentin Delafosse Leprevost" <quentin.delafosse@etudiant.univ-rennes.fr>

Cc: "Valerie Le Palmec" <valerie.le-palmec@univ-rennes.fr>

"Louison Renault" <louison.renault@etudiant.univ-rennes.fr>

"Ewenn Ruellou" <ewenn.ruellou@etudiant.univ-rennes.fr>

Bonjour M. Delafosse,

Je suis rassurée d'apprendre que le projet avance bien car nous ne pourrions accepter aucun délai supplémentaire étant donné les retards engendrés par le gros oeuvre (dans le souci de préserver au mieux l'environnement).

En ce qui concerne le local dédié à votre installation d'une baie de brassage, il n'est pas envisageable d'utiliser la gaine technique réservée à la gestion des fluides du bâtiment (les eaux propres et usées ainsi que le réseau de chauffage).

Par contre le local d'entretien à côté du garage peut éventuellement être utilisé. Nous travaillons actuellement sur plusieurs projets d'occupation de cet espace, il suffirait de nous indiquer vos besoins pour que nous puissions les intégrer à notre aménagement.

Enfin, votre interrogation concernant la lecture de pointillés sur nos plans est en effet légitime : il s'agit de la hauteur des plafonds car nous réservons un espace au-dessus pour l'isolation thermique.

J'attends avec beaucoup d'intérêt votre proposition lors notre prochain rendez-vous.

Bien cordialement,

Laura Anderson
Responsable Six Senses France
